Plungės rajono savivaldybės
SUDERINTA
administracijos direktorius
Dalius Pečiulis

TVIRTINU
UAB Plungės šilumos tinklai
Generalinis direktorius
2026-10-01

UAB Plungės šilumos tinklai

2026/2027 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas, Plungės m. V. Mačernio ir Lentpjūvės gatvių katilinėms, dirbančioms pagal temperatūrinį režimą

T_{oro} °C	T_{pad} °C	T_{gr} °C
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65	43
-1	66,4	43,6
-2	67,7	44,2
-3	69,1	44,8
-4	70,5	45,4
-5	71,8	46
-6	73,2	46,6
-7	74,5	47,2
-8	75,9	47,8
-9	77,3	48,4
-10	78,6	49
-11	80	49,6
-12	81,4	50,2
-13	82,7	50,8
-14	84,1	51,4
-15	85,5	52
-16	86,8	52,6
-17	88,2	53,2
-18	89,5	53,8
-19	90,9	54,4
-20	92,3	55
-21	93,6	55,6
-22	95	56,2
-23	95	56,2

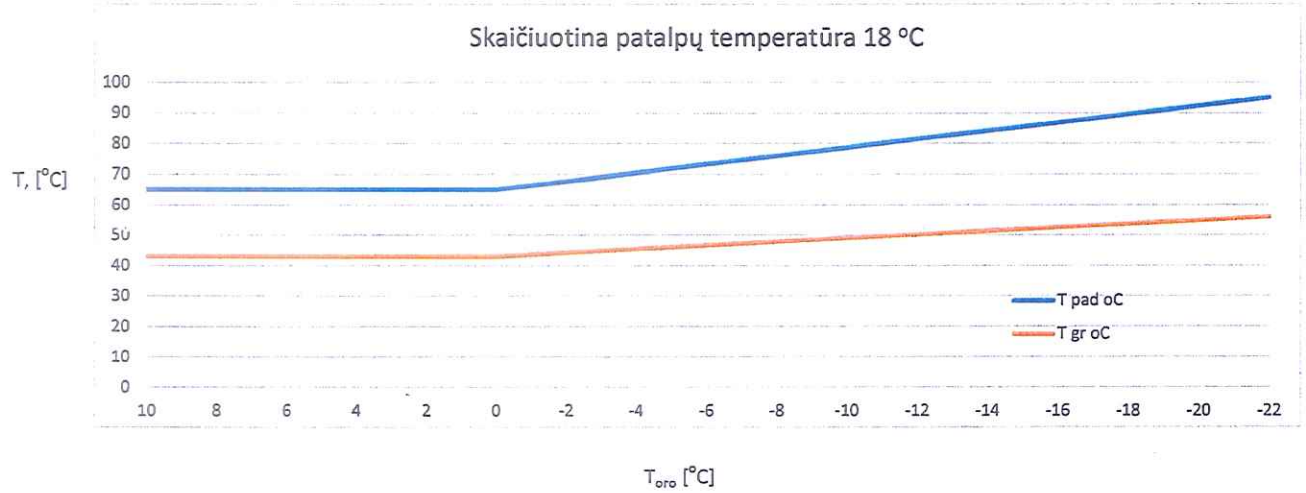

Pastaba: lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -23°C, pakelti paduodamą slėgį 1 baru. Automatizuotose šilumos punktuose pagal poreikį pakelti šildymo kreivės nuolydį.

Sudarė: Technikos vadovas Romas Luotė

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
SUDERINTA Talius Pečiulis

TVIRTINU
UAB Plungės šilumos tinklai
Generalinis direktorius
2026-10-01

UAB Plungės šilumos tinklai

2026/2027 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas, Plungės rajono kaimų katilinėms, dirbančioms pagal temperatūrin režimą

T_{oro}, °C	T_{pad}, °C	T_{gr}, °C
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65,8	43,6
-1	66,6	44,2
-2	67,2	45,8
-3	68	46,4
-4	68,8	47
-5	69,6	47,6
-6	70,4	48,2
-7	71,2	48,8
-8	72	49,4
-9	72,8	50
-10	73,6	50,6
-11	74,4	51,2
-12	75,2	51,8
-13	76	52,4
-14	76,8	53
-15	77,6	53,6
-16	78,4	54,2
-17	79,2	54,8
-18	80	55,4
-19	80,8	56
-20	81,6	56,6
-21	82,5	57,2
-22	83,6	57,8
-23	85	58,5

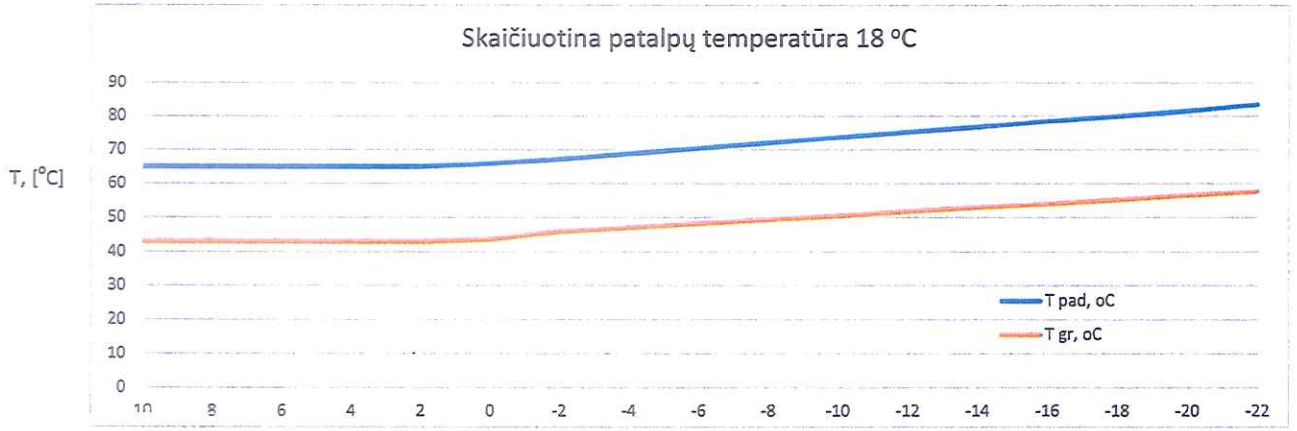

Sudarė: Technikos vadovas Romas Luotė
